

Etat des lieux du réseau de l'Observatoire Sismologique du Nord-Est de la France (ObsNEF, EOST)

RESIF CNRS

Maxime Bes de Berc, Hélène Jund, Hervé Wodling, Celeste Broucke, Cécile Doubre

NEUF Neufchef (88) / Classe A (P1) / Site fermé
Trillium 120QA / Centaur 3 - 220 v / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

Reste à faire: - serveur temps

VOEL Voellerdingen (67) / B (Ademe) / Forage (20m)
Trillium120 PH/ Q330S+ Sol / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

LEMB Lembach (67) / Classe B (Ademe) / site fermé
Trillium Compact 120 / Q330S+ - 220 v / ADSL

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

NEEW Neewiller (68) / B (Ademe) / Forage (40m)
Trillium120Compact PH/ Q330S+ Sol / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

N23-BETHI Béthincourt (55) / Classe A (P3)
Tests de sites réalisés en 2019 - 220V / ADSL

Station en construction (soumis à validation)

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

MANO Manonville (88) / Classe B (P1) / Forage (5m)
Trillium 120PH / Centaur 3 - 220 v / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

CIEL Dossenheim-s/ Zinsel (67) / B (Ademe) / site fermé
Trillium Compact / Q330S+ - 220 v / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

HOHE Hohengoëff (67) / B (Ademe) / Forage (20m)
Trillium120 PH/ Q330S+ Sol / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

SZBH Soultz s/ Forêts(67) / Classe B / Forage (200m)
Guralp CMG-3T /Guralp CMG-DMC - 220 v / ADSL

Station opérationnelle (!)

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.


Problèmes capteurs

MOLES Molesnes (21) / Classe B (P2)
Tests de sites réalisés été 2019 - 220V / ADSL

Station en construction

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

* Convention: 11.2019 * Intégration: 02.2020
* Forage: 01.2020

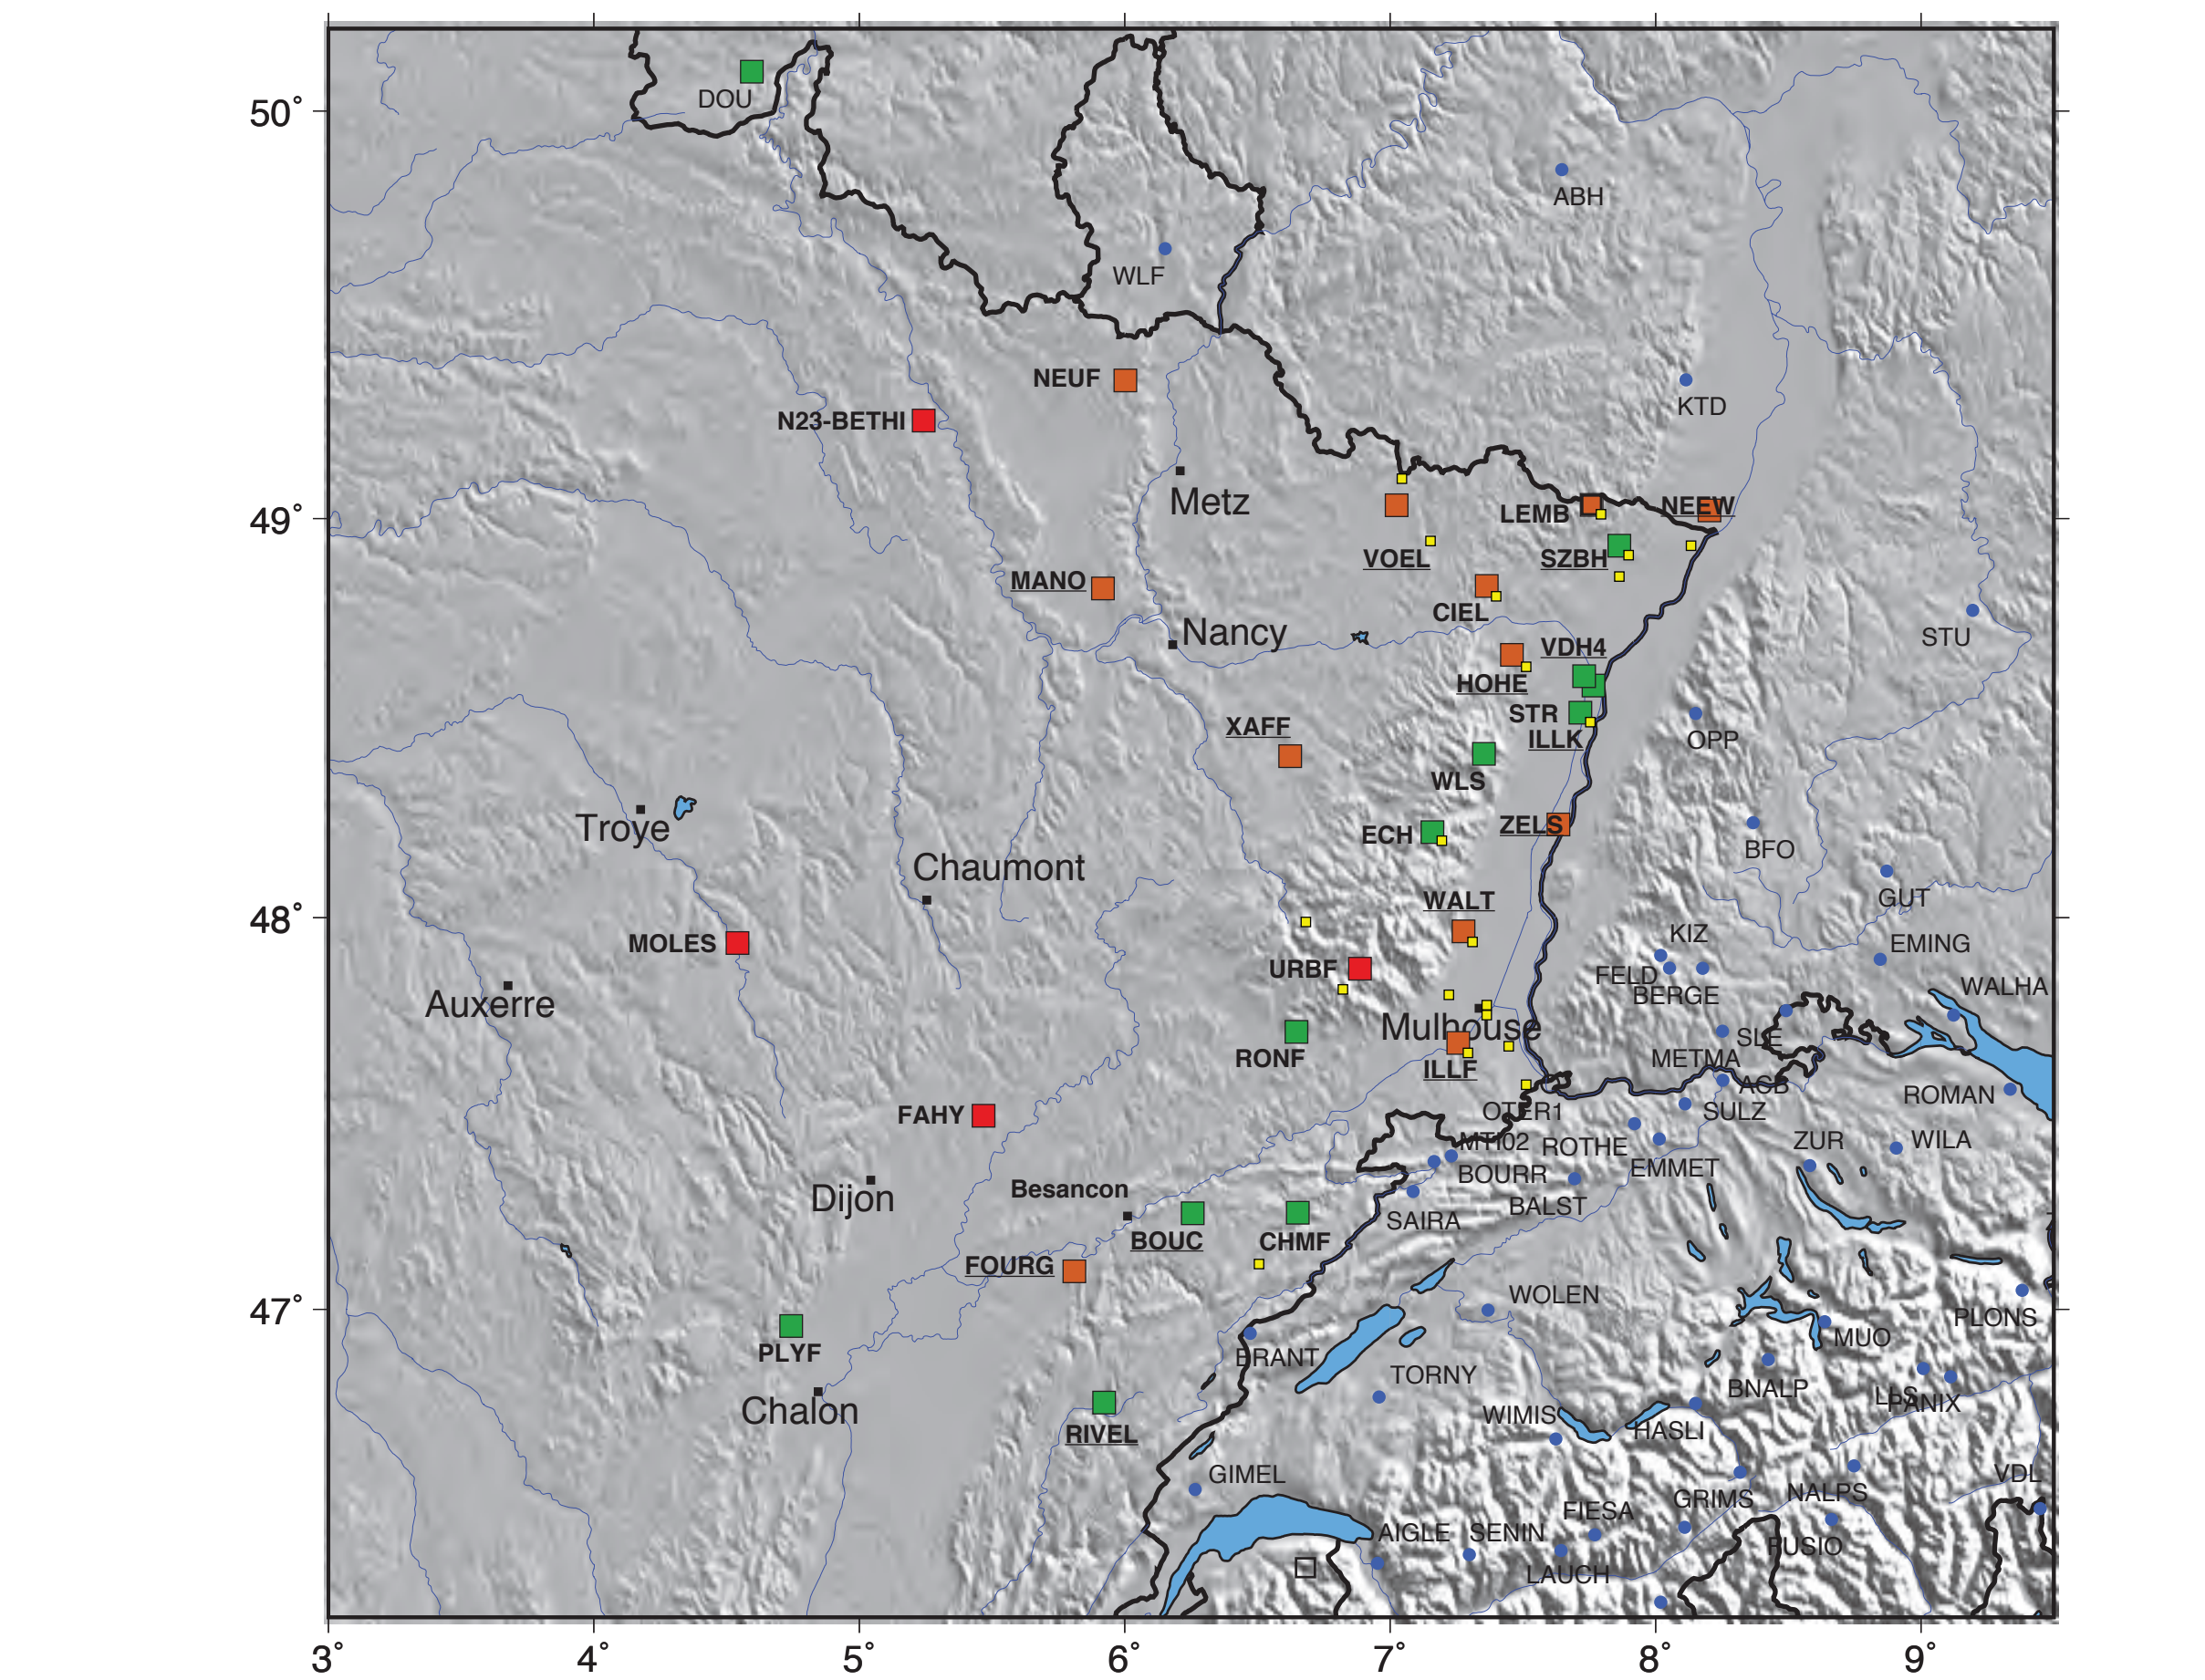

XAFF Xaffeviller (88) / Classe B (P1) / Forage (5m)
Trillium 120PH / Centaur 3 - 220 v / ADSL

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

Reste à faire: - clôture + consuel (11.2019)

WLS Welschbruch (67) / Classe A / site fermé
Trillium40 / Q330 - 220 v / ADSL

Station opérationnelle (2011)

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

PLYF Puligny-Montrachet (21) / Classe B (P1) / site fermé
Trillium 120QA / Centaur 3 - 220 v / 4G

Station opérationnelle:

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

URBF Urbès (68) / Classe B (P3) / site fermé
Tests de sites réalisés en 2014 - 220V / ADSL

Station en construction

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

* Nouveaux tests de sites prévus à différentes distances de l'entrée du tunnel, long de 2.5 km

ZELS Hohengoëff (67) / B (Ademe) / Forage (40m)
Trillium120 PH/ Q330S+ Sol / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

FOURG Fourg (25) / Classe B (P1) / Forage (5m)
Trillium 120PH / Centaur 3 - 220 v / ADSL

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

BOUC Bouclans (88) / Classe B (P1) / Forage (5m)
Trillium 120PH / Centaur 3 - 220 v / ADSL

Station opérationnelle (2018)

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

CHMF Charmoilles (25) / Classe A / site fermé
STS2 / Q330HR - 220 v / 4G

Station opérationnelle (2009)

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

RONF Ronchamp (77) / Classe B (P1) / site fermé
Trillium 120QA / Centaur 3 - 220 v / 4G


Station opérationnelle (2018):

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

WALT Westhalten (68) / B (Ademe) / Forage (20m)
Trillium120Compact PH/ Q330S+ Sol / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

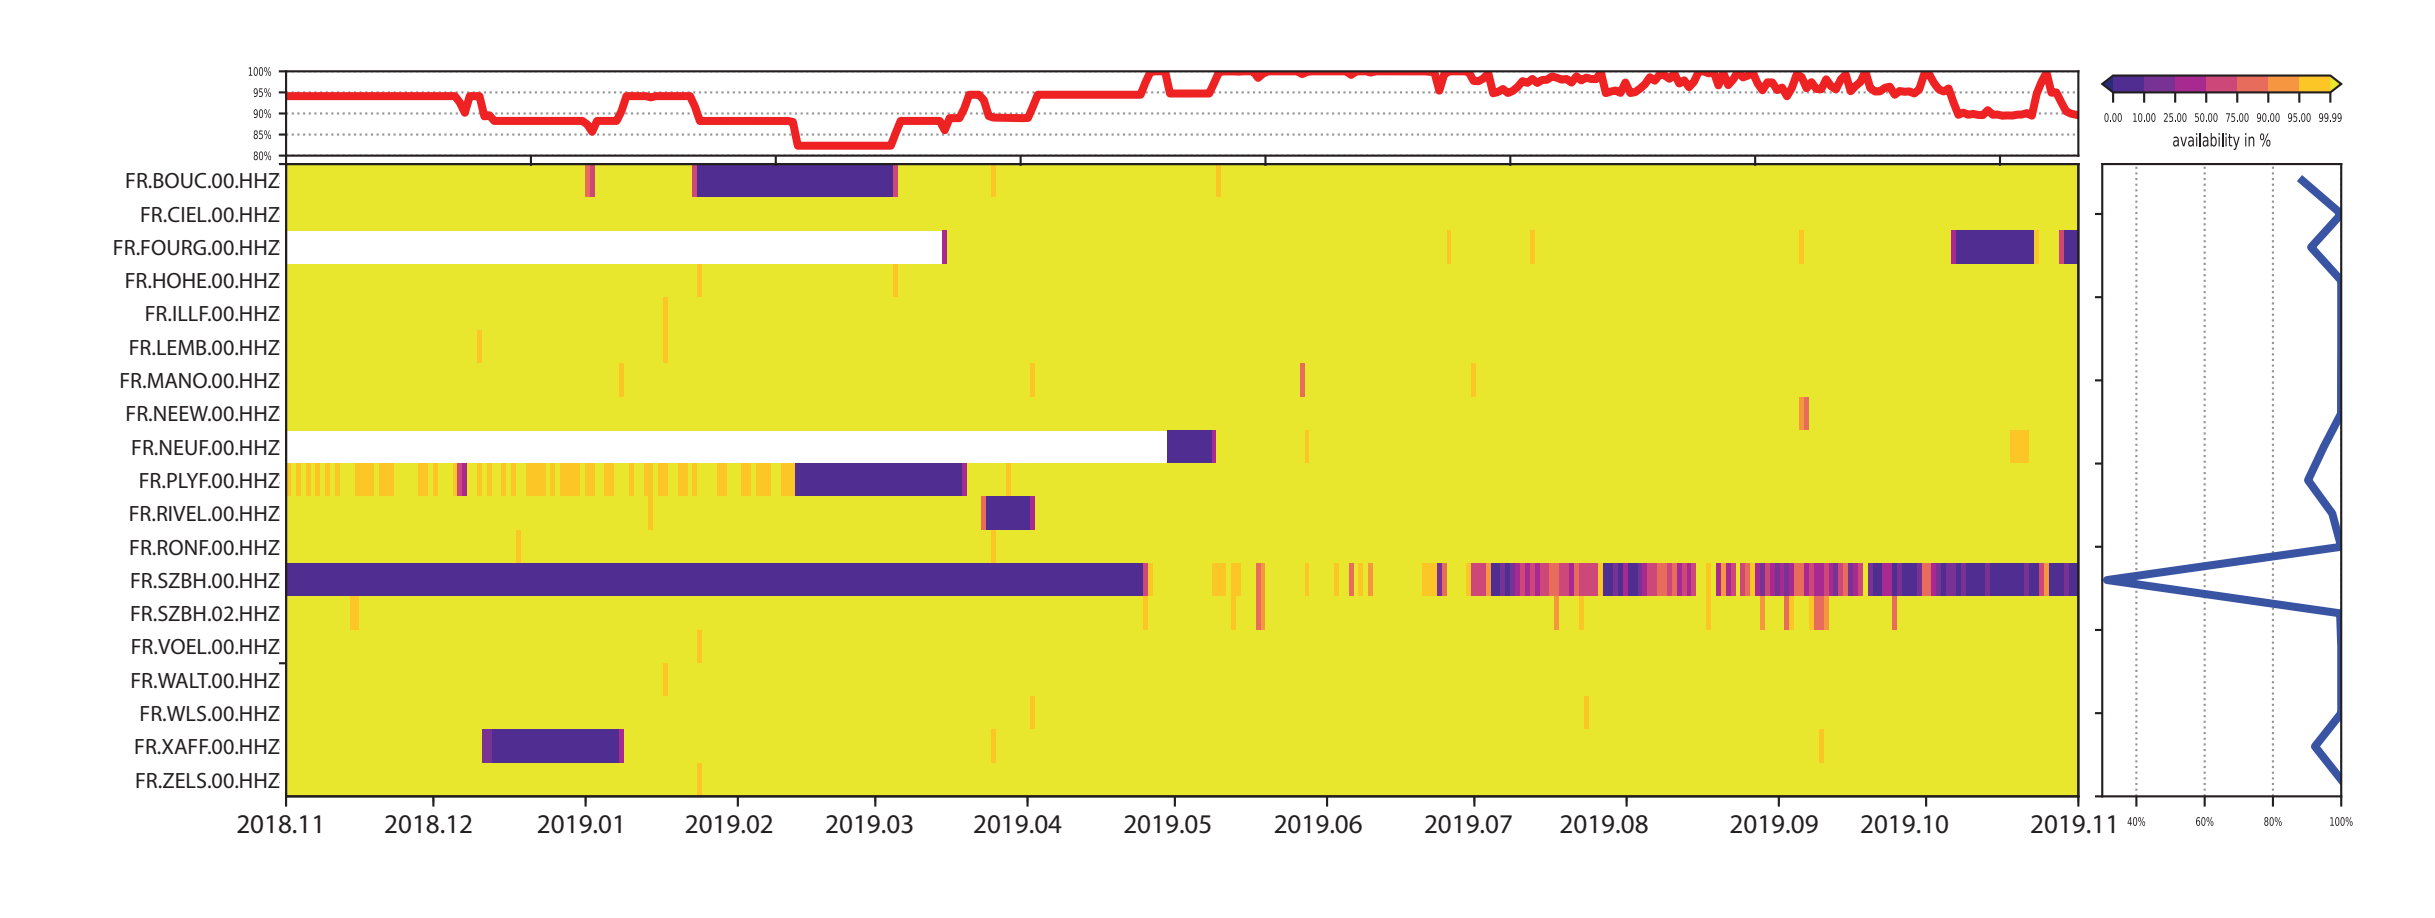

FAHY Fahy-les-Autrey (88) / Classe B (P1) / Forage (5m)
Trillium 120PA / Centaur 3 - 220 v / 4G

Station en construction

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

* Installation capteur / automates / numériseur : octobre 2019

Reste à faire: - consuel
- alimentation sismo (fin 2019)

RIVEL Mont Rivel (39) / Classe A (P1) / Forage (5m)
Trillium 120PH / Centaur 3 - 220 v / 4G

Station opérationnelle (2018)

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.

ILLF Illfurth (68) / B (Ademe) / Forage (20m)
TrilliumCompact120PH/ Q330S+ - Sol / 4G

Station en cours d'intégration

Validation Convention Intégration
Infra. site Electricité Comm.
